

# AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

Provincia di Nuoro



## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

#### ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

#### ALLEGATO

# H

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nannina SPANU

#### IL SINDACO

Sig. Nino CANZANO

DATA: Dicembre 2020

AGG.:

AGG.:

AGG.:

#### IL PROGETTISTA



**Edilogica** s.r.l.  
Ingegneria - Architettura - Urbanistica

Ing. Francesco CHESSA

ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI NUORO  
N. A268 - Settori A B C  
Dr. Ing. Francesco Chessa

REV. 00:

REV. 01:

DATA APPROVAZIONE:

FILE: Copertina\_Allegati.dwg

# PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di OROSEI

Provincia di NUORO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  
VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

## CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 204.855,41
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
IVA su lavori e sicurezza	€ 46.168,19
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.976,40
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 280.000,00</b>

Orosei, li Dicembre 2020

Il Progettista:  
ING. FRANCESCO CHESSA

---

ID	Nome	Durata 33,00 g - (45 g)	Inizio	Fine	01 feb 21							08 feb 21							15 feb 21							22 feb 21							01 mar 21							08 mar 21						
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	n				
1	1 - Scavi e Riconfigurazioni	10,00	un 01/02/21	ven 12/02/21																																										
2	2 - Sottofondazioni	10,00	un 15/02/21	ven 26/02/21																																										
3	3 - Scarificazioni - Fresature	22,00	un 01/02/21	mar 02/03/21																																										
4	4 - Pavimentazioni	23,00	un 15/02/21	mer 17/03/21																																										
5	5 - Opere di completamento	11,00	mer 03/03/21	mer 17/03/21																																										



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di OROSEI  
Provincia di NUORO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  
VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

PROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 204.855,41
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
IVA su lavori e sicurezza	€ 46.168,19
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.976,40
Costo complessivo dell'opera	€ 280.000,00

Orosei, li Dicembre 2020

Il Progettista:  
ING. FRANCESCO CHESSA

---

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 01/02/2021 a 18/02/2021	da 19/02/2021 a 03/03/2021	da 04/03/2021 a 17/03/2021			
1 - Scavi e Riconfigurazioni	€ 10.068,45	€ 10.068,45					
2 - Sottofondazioni	€ 3.565,31	€ 1.426,12	€ 2.139,19				
3 - Scarificazioni - Fresature	€ 73.354,32	€ 46.680,02	€ 26.674,30				
4 - Pavimentazioni	€ 94.312,73	€ 16.402,21	€ 36.904,98	€ 41.005,54			
5 - Opere di completamento	€ 23.554,60		€ 2.141,33	€ 21.413,27			
IMPORTO		€ 74.576,80	€ 67.859,80	€ 62.418,81			
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 74.576,80	€ 142.436,60	€ 204.855,41			
%		36,40%	33,13%	30,47%			
% PROGRESSIVA		36,40%	69,53%	100,00%			

# PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di OROSEI

Provincia di NUORO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  
VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

## PROGRAMMAZIONE S.A.L.

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 204.855,41
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
IVA su lavori e sicurezza	€ 46.168,19
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.976,40
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 280.000,00</b>

Orosei, li Dicembre 2020

Il Progettista:

ING. FRANCESCO CHESSA

---

## PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
	14	14	€ 74.576,80	€ 74.576,80	36,40%	Si
	23	9	€ 142.436,60	€ 67.859,80	69,53%	Si
	33	10	€ 204.855,41	€ 62.418,81	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



# PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di OROSEI  
Provincia di NUORO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  
VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI OROSEI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI

## DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI


(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 204.855,41
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
IVA su lavori e sicurezza	€ 46.168,19
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.976,40
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 280.000,00</b>

Orosei, li Dicembre 2020

Il Progettista:  
ING. FRANCESCO CHESSA

---

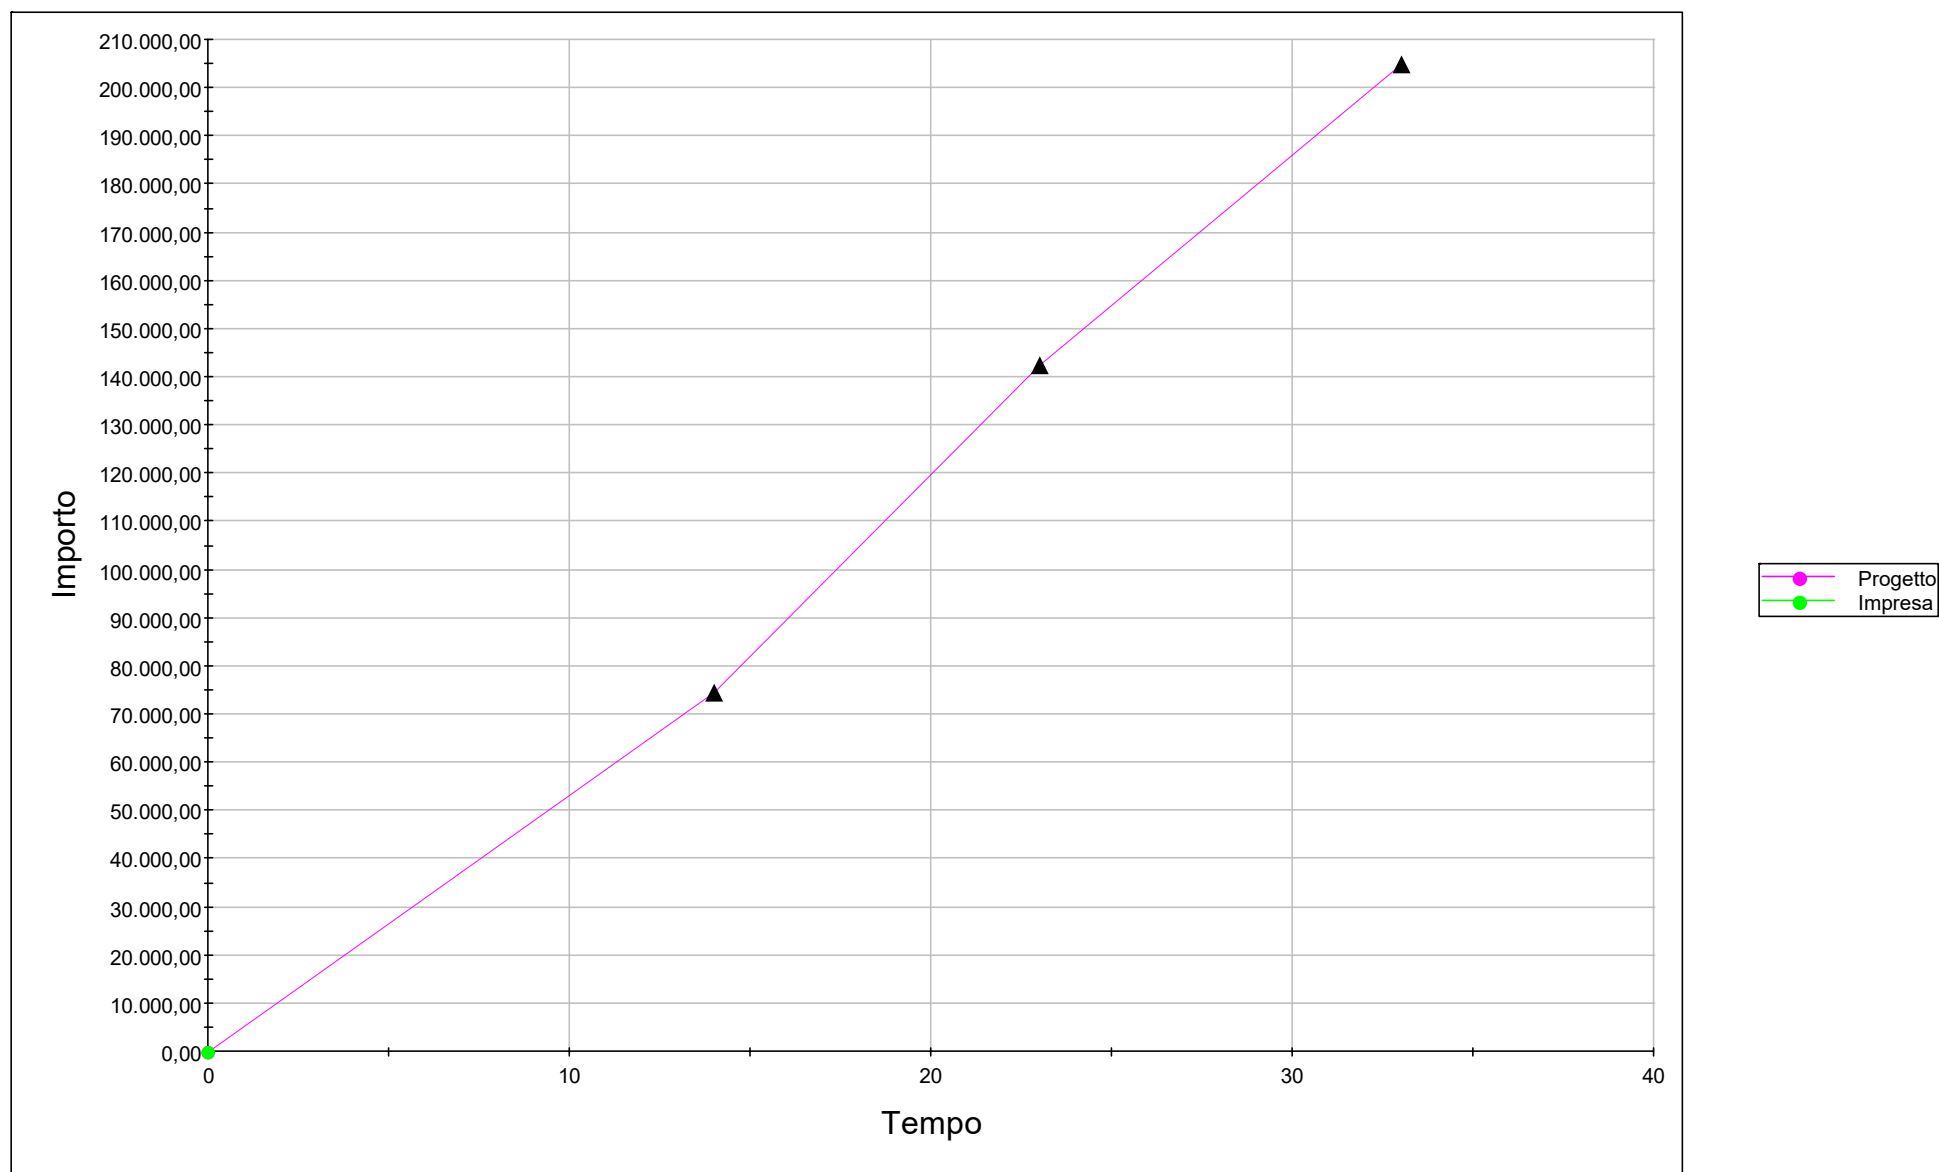

LEGENDA:    ■ punto che delimita periodi a media di produzione costante  
              ■ Stato Avanzamento Lavori programmato
